

建築工事業向編

使える建設原価

建築工事は一般的には工種ごとで業者（仕入先）の予算を作成して、月毎に一式の金額で管理されるケースが多いです。原価月報がひと月単位で確認する帳票になります。何ヶ月かまとめて一度に確認するのが工事台帳（集計）タイプになります。

次に工事ごとで原価を月毎に推移を確認したり、工事の業者で原価の推移を確認したりします。それが月別原価推移表です。

縦軸と横軸に仕入先と工事をとってマトリックスで印刷します。件数が増えると次ページに印刷されます。仕入先と工事の数字が一度に確認できる究極の帳票です。とても喜ばれます。仕入先別費用集計表です。

お客様によって違うケースも多いので、出力帳票集でご確認して頂いてください。

工事台帳

出力期間 平成15年06月21日 ~ 平成15年08月20日 (税抜き)

作成日 平成15年12月11日

ページ 1

工事番号	10 -00
工事名	山口邸新築工事
工事場所	岡山県津山市東一宮52-1
発注者	山口秀太
予定工期	平成15年05月01日 ~ 平成15年11月30日
実際工期	平成15年05月01日 ~ 年 月 日
現場担当者	浅倉 太郎 営業担当者阿部 肇
備考	

実行予算	材料費	14,093,800
	労務費	0
	外注費	800
	経費	0
	計	14,094,600
	原価	7,699,038
	消費税	269,285
粗利	3,590,875	
粗利率	31.81%	

契約日	契約金額
H.15/04/02	11,289,913
税抜合計	11,289,913
消費税	0
税込合計	11,289,913

請求履歴		入金履歴	
以前累計	0	以前累計	0
H.15年02月	2,080,000	H.15年07月	3,000,000
H.15年06月	3,000,000		
H.15年07月	100,000		
H.15年08月	4,761,904		
請求合計	9,941,904	入金合計	3,000,000

日付	工種名	仕入先名	名称	仕様	数量	単位	材料費	労務費	外注費	経費	合計
				繰越金額			479,800	60,800	945,000	0	1,485,600
07/05	土工	北海道建材株式会社	砕石地業	60	50		350,000				
	"	"	捨てコンクリート	FC180kg	10	"	100,000				
	"	"	本体工事	加工、組立、ボルト締	5	t	1,100,000				
	"	"	デッキプレート	V.50 1、2加工取付	4	"	720,000				
	"	"	窓手摺スチールパイプ	L:1400	5	ヶ所	25,000				
07/11	"	"	砕石地業	60	50		350,000				
	"	"	捨てコンクリート	FC180kg	10	"	95,238				
	"	"	デッキプレート	V.50 1、2加工取付	4	t	720,000				
07/15	土・基礎工事	岩手興業株式会社	土工		1	式			270,000		
	コンクリート	新潟建設株式会社	基礎工事		1	"			260,000		
	鉄骨工事	静岡鉄工株式会社	鉄筋工事		1	"			700,000		
	防水工事	滋賀防水有限会社	防水工事		1	"			120,000		
07/20		アサクラ建設	自社労務費					23,200			
		"	自社損料							8,400	
			平成15年07月度計				3,460,238	23,200	1,350,000	8,400	4,841,838
			累計				3,940,038	84,000	2,295,000	8,400	6,327,438
08/15	土・基礎工事	岩手興業株式会社	土工		1	式			145,000		
	型枠工事	新潟建設株式会社	基礎工事		1	"			350,000		
	鉄骨工事	静岡鉄工株式会社	鉄筋工事		1	"			450,000		
	防水工事	滋賀防水有限会社	防水工事		1	"			240,000		
08/18	土・基礎工事	岩手興業株式会社	土工		1	"			15,000		
	経費	アサクラ建設	水道代他		1	"				28,000	
08/20		"	自社労務費					143,600			
			平成15年08月度計				0	143,600	1,200,000	28,000	1,371,600
			合計				3,940,038	227,600	3,495,000	36,400	7,699,038

請求履歴を表示したり表示しなかったり、明細のまま印刷するか業者で集計して印刷することもできます。
アサクラ独自の書式変更で、工種名の列を削除したり設定してある単価の項目とか入金の項目を追加したりして変更することができます。

原 価 月 報

出力期間 平成15年09月01日 ~ 平成15年09月30日 (税抜き)

作成日 平成15年09月30日 ページ 1

工事番号1509001-00 06-1234-5678 06-3456-7890

工事名	小大規模改造工事
工事場所	市区
発注者	市
予定工期	平成15年08月01日 ~ 平成15年12月31日
実際工期	平成15年08月05日 ~ 年 月 日
備考	

官民区分	官 庁
元下請区分	元 請
分類	建築一式
現場担当者	浅倉 太郎
営業担当者	永田 次郎

契約金額	消費税額	税抜合計	税込合計
26,202,660	1,310,133	26,202,660	27,512,793

原 価	6,054,290	粗 利	20,148,370	76.89
実行予算	23,124,910	予算粗利	3,077,750	11.74
予想原価	21,346,654	予想粗利	4,856,006	18.53

工種名	仕入先名	見積金額	実行予算			発注金額	前月迄原価	当月原価	累計原価	対発注残	消化%	進捗%	今後予想原価	差 額
			実行予算	修正予算	計									
1002 直接仮設工事	岩手興業株式会社	3,386,700	2,935,140	0	2,935,140	2,709,360	1,654,320	1,055,040	2,709,360	0	100	100	0	0
1018 組積工事	千葉興業株式会社	81,000	70,200	0	70,200	64,800	0	64,800	64,800	0	100	100	0	0
1020 防水工事	滋賀防水有限会社	3,983,480	3,381,330	0	3,381,330	3,121,730	0	3,121,730	3,121,730	0	100	100	0	0
1022 石工事	京都石材商店	198,000	171,600	0	171,600	158,400	0	158,400	158,400	0	100	100	0	0
1024 タイル工事	兵庫タイル商会	566,170	490,680	0	490,680	452,940	0	0	0	452,940	0	0	452,940	0
1032 左官工事	広島左官	429,100	371,810	0	371,810	343,280	0	0	0	343,280	0	0	343,280	0
1033 吹付工事	徳島装美株式会社	6,591,850	5,712,940	0	5,712,940	5,273,484	0	0	0	5,273,484	0	0	5,273,484	0
1040 塗装工事	高知塗装株式会社	7,676,020	6,652,550	0	6,652,550	6,140,820	0	0	0	6,140,820	0	0	6,140,820	0
1042 内装工事	富山建設株式会社	2,809,800	2,435,160	0	2,435,160	2,247,840	0	0	0	2,247,840	0	0	2,247,840	0
【直接工事費計】		25,722,120	22,221,410	0	22,221,410	20,512,654	1,654,320	4,399,970	6,054,290	14,458,364	29.51	29.51	14,458,364	0
9110 共通費		90,000	78,000	0	78,000	72,000	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0
【間接工事費計】		90,000	78,000	0	78,000	72,000	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0
9201 現場経費		952,500	825,500	0	825,500	762,000	0	0	0	762,000	0	0	762,000	0
【現場経費計】		952,500	825,500	0	825,500	762,000	0	0	0	762,000	0	0	762,000	0
合 計		26,764,620	23,124,910	0	23,124,910	21,346,654	1,654,320	4,399,970	6,054,290	15,292,364	28.36	28.36	15,292,364	0

工種の内訳の明細でも管理することができます。

工事台帳(集計)

出力期間 平成13年05月21日～平成13年11月20日 (税抜き)

作成日 平成13年08月20日

ページ 1

工事番号 10 -00

工事名	山口邸新築工事
工事場所	岡山県津山市東一宮52-1
発注者	山口秀太
実際工期	平成13年05月01日～ 年 月 日

官民区分	民間
元下請区分	元請
工事分類	建築一式
現場担当者	浅倉 太郎
営業担当者	阿部 肇

契約金額	消費税額	税抜合計	税込合計
26,000,000	1,238,095	24,761,905	26,000,000

工事原価	6,021,400	工事粗利	18,740,505	75.68%
実行予算	14,085,800	予算粗利	10,676,105	43.12%

売上額	3,000,000	4,761,904	7,619,049	15,380,953
入金額	3,000,000	11,000,000	8,000,000	22,000,000

工種名	仕入先名	実行予算	修正予算	前月迄累計	H13年6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計
直接仮設工事	北海道建材株式会社	0	0	0				790,000			790,000
"	青森建材株式会社	0	0	0				1,200,000			1,200,000
"	岩手興業株式会社	385,000	0	188,000	122,800						310,800
土・基礎工事	"	600,000	0	0	80,000	270,000	160,000				510,000
杭・基礎工事	新潟建設株式会社	450,000	0	200,000	245,000						445,000
コンクリート	"	258,000	200,000	0		260,000					260,000
型枠工事	"	582,000	200,000	0			350,000				350,000
鉄骨工事	静岡鉄工株式会社	1,800,000	0	0	350,000	700,000	450,000				1,500,000
防水工事	滋賀防水有限会社	486,000	0	0		120,000	240,000				360,000
タイル工事	兵庫タイル商会	324,000	0	0							0
金属工事	奈良板金株式会社	745,800	0	0							0
屋根工事	鳥取瓦株式会社	2,000,000	0	0							0
左官工事	岡山左官	747,000	0	0							0
建具工事	山口建具店	865,000	0	0							0
金属製建具工	"	584,000	0	0							0
ガラス工事	愛媛ガラス店	584,000	0	0							0
塗装工事	高知塗装株式会社	854,000	0	0							0
内装工事	福岡装飾有限会社	1,256,000	0	0							0
住宅設備工事	熊本設備株式会社	485,000	0	0							0
労務費	アサクラ建設株式会社	500,000	0	0							0
経費	"	80,000	100,000	0			171,600	124,000			295,600
	合計	13,585,800	500,000	388,000	797,800	1,350,000	1,371,600	2,114,000	0	0	6,021,400
	累計			388,000	1,185,800	2,535,800	3,907,400	6,021,400	6,021,400	6,021,400	6,021,400

原価月報と同じ予算を使用します。
 工種別仕入先別・工種別・仕入先別工種別・仕入先別で印刷できます。
 書式変更できるので12ヶ月まで一度で見れるように変更できます。

(税抜き)

実行予算書

作成日 平成15年08月01日 へ→ 1

工事番号1509001-00 06-1234-5678 06-3456-7890

工事名	小天規模改造工事
工事場所	市区
発注者	市
予定工期	平成15年08月01日 ~ 平成15年12月31日
実際工期	平成15年08月05日 ~ 年月日
備考	

官民区分	官庁
元下請区分	元請
工事分類	建築一式
現場担当者	浅倉 太郎
営業担当者	永田 次郎

契約金額	消費税額	税抜合計	税込合計
26,202,660	1,310,133	26,202,660	27,512,793
実行予算	発注金額	予定粗利	予定粗利率
23,124,910	21,346,654	3,077,750	11.75

	工種名	仕入先名	見積金額	見積構成比	実行予算	予算構成比	発注金額	発注構成比	見積 - 実行	実行 - 発注	見積 - 発注	備考
1002	直接仮設工事	岩手興業株式会社	3,386,700	12.65	2,935,140	12.69	2,709,360	12.69	451,560	225,780	677,340	
1018	組積工事	千葉興業株式会社	81,000	0.3	70,200	0.3	64,800	0.3	10,800	5,400	16,200	
1020	防水工事	滋賀防水有限会社	3,983,480	14.88	3,381,330	14.62	3,121,730	14.62	602,150	259,600	861,750	
1022	石工事	京都石材商店	198,000	0.74	171,600	0.74	158,400	0.74	26,400	13,200	39,600	
1024	タイル工事	兵庫タイル商会	566,170	2.12	490,680	2.12	452,940	2.12	75,490	37,740	113,230	
1032	左官工事	広島左官	429,100	1.6	371,810	1.61	343,280	1.61	57,290	28,530	85,820	
1033	吹付工事	徳島装美株式会社	6,591,850	24.63	5,712,940	24.7	5,273,484	24.7	878,910	439,456	1,318,366	
1040	塗装工事	高知塗装株式会社	7,676,020	28.68	6,652,550	28.77	6,140,820	28.77	1,023,470	511,730	1,535,200	
1042	内装工事	富山建設株式会社	2,809,800	10.5	2,435,160	10.53	2,247,840	10.53	374,640	187,320	561,960	
	【直接工事費計】		25,722,120	96.1	22,221,410	96.09	20,512,654	96.09	3,500,710	1,708,756	5,209,466	
9110	共通費		90,000	0.34	78,000	0.34	72,000	0.34	12,000	6,000	18,000	
	【間接工事費計】		90,000	0.34	78,000	0.34	72,000	0.34	12,000	6,000	18,000	
9201	現場経費		952,500	3.56	825,500	3.57	762,000	3.57	127,000	63,500	190,500	
	【現場経費計】		952,500	3.56	825,500	3.57	762,000	3.57	127,000	63,500	190,500	
	合計		26,764,620	100	23,124,910	100	21,346,654	100	3,639,710	1,778,256	5,417,966	

一般的には明細まで管理しないケースが多く工種止まりです。

(税抜き)

実行予算書

作成日 平成15年08月01日 ページ 1

工事番号1509001-00 06-1234-5678 06-3456-7890

工事名	小規模改造工事
工事場所	市区
発注者	市
予定工期	平成15年08月01日 ~ 平成15年12月31日
実際工期	平成15年08月05日 ~ 年月日
備考	

官民区分	官庁
元下請区分	元請
工事分類	建築一式
現場担当者	浅倉 太郎
営業担当者	永田 次郎

契約金額	消費税額	税抜合計	税込合計
26,202,660	1,310,133	26,202,660	27,512,793

実行予算	発注金額	予定粗利	予定粗利率
23,124,910	21,346,654	3,077,750	11.75

	名称	仕様	見積				実行予算				発注		
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	数量	単価	金額
1002	直接仮設工事	岩手興業株式会社											
	外部足場	材工 W=900	1536	m ²	1500	2,304,000	1536	m ²	1300	1,996,800	1536	1200	1,843,200
	外部足場	ブラケット =900	516	m ²	675	348,300	516	m ²	585	301,860	516	540	278,640
	階段足場	枠組+単管	98	m ²	1800	176,400	98	m ²	1560	152,880	98	1440	141,120
	外部養生メッシュシート	材工	860	m ²	300	258,000	860	m ²	260	223,600	860	240	206,400
	材料運搬	4t 20車	1	式		300,000	1	式		260,000	1		240,000
	工種計					3,386,700				2,935,140			2,709,360
1018	組積工事	千葉興業株式会社											
	コンクリートブロック積	T=100	12	m ²	6750	81,000	12	m ²	5850	70,200	12	5400	64,800
	工種計					81,000				70,200			64,800
1020	防水工事	滋賀防水有有限会社											
	シート防水	押金物共	266	m ²	9525	2,533,650	266	m ²	8255	2,195,830	266	7620	2,026,920
	コーキング	10×10 C種	1185	m	970	1,149,450	1185	m	780	924,300	1185	720	853,200
	コーキング撤去		653	m	460	300,380	653	m	400	261,200	653	370	241,610
	工種計					3,983,480				3,381,330			3,121,730
1022	石工事	京都石材商店											
	便所繕板御影石	20×120	12	m	16500	198,000	12	m	14300	171,600	12	13200	158,400
	工種計					198,000				171,600			158,400
1024	タイル工事	兵庫タイル商会											
	タイル工事		1	式		566,170	1	式		490,680	1		452,940
	工種計					566,170				490,680			452,940
1032	左官工事	広島左官											
	左官工事		1	式		429,100	1	式		371,810	1		343,280
	工種計					429,100				371,810			343,280
1033	吹付工事	徳島装美株式会社											
	吹付工事		1	式		6,591,850	1	式		5,712,940	1		5,273,484
	工種計					6,591,850				5,712,940			5,273,484
1040	塗装工事	高知塗装株式会社											
	塗装工事		1	式		7,676,020	1	式		6,652,550	1		6,140,820

明細まで管理することもできます。

(税抜き)

実行予算書

作成日 平成15年08月01日 ページ 2

工事番号1509001-00 06-1234-5678 06-3456-7890

工事名	小大規模改造工事
工事場所	市区
発注者	市
予定工期	平成15年08月01日 ~ 平成15年12月31日
実際工期	平成15年08月05日 ~ 年月日
備考	

官民区分	官庁
元下請区分	元請
工事分類	建築一式
現場担当者	浅倉 太郎
営業担当者	永田 次郎

契約金額	消費税額	税抜合計	税込合計
26,202,660	1,310,133	26,202,660	27,512,793

実行予算	発注金額	予定粗利	予定粗利率
23,124,910	21,346,654	3,077,750	11.75

	名称	仕様	見積				実行予算				発注			
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	数量	単価	金額	
	工種計					7,676,020				6,652,550				6,140,820
1042	内装工事	富山建設株式会社												
	内装工事		1	式		2,247,840	1	式		2,435,160	1			2,247,840
	工種計					2,247,840				2,435,160				2,247,840
	【直接工事費計】					25,160,160				22,221,410				20,512,654
9201	現場経費													
	調整額					952,500				825,500				762,000
	工種計					952,500				825,500				762,000
	【現場経費計】					952,500				825,500				762,000
1042	内装工事	富山建設株式会社												
	調整額					561,960								
	工種計					561,960								
	【直接工事費計】					561,960								
9110	共通費													
	調整額					90,000				78,000				72,000
	工種計					90,000				78,000				72,000
	【間接工事費計】					90,000				78,000				72,000
	合計					26,764,620				23,124,910				21,346,654

工事総括表

工 事 名	請負先名	税抜契約金額 消費税額	当月売上(抜) 累計売上(抜)	当月消費税 累計消費税	当月売上(込) 累計売上(込)	当月入金 累計入金	未収入金 売掛残高	当月原価(抜) 累計原価(抜)	当月消費税 累計消費税	当月原価(込) 累計原価(込)	実行予算 予 算 残	当月支払額 累計支払額	粗 利	消化率 粗利率	
10	-00	リコー建設株式会社	24,761,905	4,761,904	0	4,761,904	3,000,000	23,000,000	1,371,600	61,400	1,433,000	23,000,000	2,630,513		16.99
		山口邸新築工事	1,238,095	7,611,904	150,000	7,761,904	3,000,000	4,761,904	3,907,400	188,190	4,095,590	19,092,600	2,772,263	20,854,505	84.22
20	-00	諸口	50,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	52,500,000	156,200	2,850	159,050	48,000,000	0		0.33
		永田邸新築工事	2,500,000	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	156,200	2,850	159,050	47,843,800	0	49,843,800	99.69
40	-00	東日本建設株式会社	35,000,000	7,619,048	380,952	8,000,000	3,000,000	33,750,000	3,444,000	137,600	3,581,600	28,000,000	5,843,500		44.26
		石川マンション設備工事	1,750,000	10,476,191	523,809	11,000,000	3,000,000	8,000,000	12,391,400	494,970	12,886,370	15,608,600	7,173,500	22,608,600	64.6
60	-00	西日本建設株式会社	63,761,905	13,390,000	669,500	14,059,500	13,250,000	48,700,000	1,926,000	96,300	2,022,300	61,000,000	1,344,000		6.57
		水路改良工事	3,188,095	34,009,048	1,300,452	40,309,500	18,250,000	22,059,500	4,007,000	200,350	4,207,350	56,993,000	1,344,000	59,754,905	93.72
80	-00	市道	58,857,143	0	0	0	0	61,800,000	476,030	17,382	493,412	53,000,000	0		1.17
		市道 号道路新設工事	2,942,857	0	0	0	0	617,780	24,470	642,250	52,382,220	0	58,239,363	98.95	
91	-00	市道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市道 号道路改良工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		未成計	232,380,953	40,770,952	1,050,452	41,821,404	19,250,000	219,750,000	7,373,830	315,532	7,689,362	213,000,000	9,818,013		9.9
			11,619,047	67,097,143	1,974,261	74,071,404	24,250,000	49,821,404	21,079,780	910,830	21,990,610	191,920,220	11,289,763	211,301,173	90.93
30	-00	リコー建設株式会社	8,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	6,425,000	6,830,000	291,500	7,121,500	7,300,000	0		93.56
		長尾邸新築工事	425,000	3,500,000	0	6,000,000	2,500,000	3,500,000	6,830,000	291,500	7,121,500	470,000	7,121,500	1,670,000	19.65
50	-00	県	73,285,715	7,695,000	384,750	8,079,750	24,020,250	52,929,750	3,624,750	25,400	3,650,150	61,000,000	1,827,840		11.33
		国道 号道路改良工事	3,664,285	17,390,000	869,500	40,179,750	24,020,250	16,159,500	6,912,250	76,525	6,988,775	54,087,750	1,827,840	66,373,465	90.57
70	-00	四国建設株式会社	20,600,000	0	0	0	3,163,000	18,467,000	1,267,750	3,800	1,271,550	16,500,000	630,000		7.68
		今井橋梁改修工事	1,030,000	8,000,000	0	11,163,000	3,163,000	8,000,000	1,267,750	3,800	1,271,550	15,232,250	630,000	19,332,250	93.85
90	-00	市道	21,580,952	0	0	0	22,660,000	0	19,740,000	713,000	20,453,000	19,500,000	0		101.77
		市道 x x 号道路改良工事	1,079,048	0	0	22,660,000	22,660,000	0	19,845,000	718,250	20,563,250	-345,000	20,563,250	1,735,952	8.04
		完成計	123,966,667	11,195,000	384,750	11,579,750	49,843,250	77,821,750	31,462,500	1,033,700	32,496,200	104,300,000	2,457,840		33.42
			6,198,333	28,890,000	869,500	80,002,750	52,343,250	27,659,500	34,855,000	1,090,075	35,945,075	69,445,000	30,142,590	89,111,667	71.88
		合 計	356,347,620	51,965,952	1,435,202	53,401,154	69,093,250	297,571,750	38,836,330	1,349,232	40,185,562	317,300,000	12,275,853	300,412,840	17.63
			17,817,380	95,987,143	2,843,761	154,074,154	76,593,250	77,480,904	55,934,780	2,000,905	57,935,685	261,365,220	41,432,353		84.3

この帳票ひとつでほとんどの数字を一度につかむことができます。
原価を4要素に別けて印刷もできます。

月別原価推移表

出力期間 平成13年03月21日～平成13年11月20日（税抜き） 未成、完成

作成日 平成13年11月30日

工事名	前月迄累計	H13年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計
10 -00	0	0	388,000	797,800	1,350,000	1,371,600	124,000	0	0	4,031,400
山口邸新築工事	0	0	388,000	1,185,800	2,535,800	3,907,400	4,031,400	4,031,400	4,031,400	4,031,400
20 -00	0	0	0	0	0	156,200	0	0	0	156,200
永田邸新築工事	0	0	0	0	0	156,200	156,200	156,200	156,200	156,200
30 -00	0	0	0	0	0	6,830,000	0	0	0	6,830,000
長尾邸新築工事	0	0	0	0	0	6,830,000	6,830,000	6,830,000	6,830,000	6,830,000
40 -00	0	0	0	1,377,500	7,569,900	3,444,000	3,468,600	0	0	15,860,000
石川マンション設備工事	0	0	0	1,377,500	8,947,400	12,391,400	15,860,000	15,860,000	15,860,000	15,860,000
50 -00	0	0	0	0	3,287,500	3,624,750	999,600	0	0	7,911,850
国道 号道路改良工事	0	0	0	0	3,287,500	6,912,250	7,911,850	7,911,850	7,911,850	7,911,850
60 -00	0	0	0	0	2,081,000	1,926,000	3,004,150	0	0	7,011,150
水路改良工事	0	0	0	0	2,081,000	4,007,000	7,011,150	7,011,150	7,011,150	7,011,150
70 -00	0	0	0	0	0	1,267,750	0	0	0	1,267,750
今井橋梁改修工事	0	0	0	0	0	1,267,750	1,267,750	1,267,750	1,267,750	1,267,750
80 -00	0	0	0	135,000	6,750	476,030	589,000	0	0	1,206,780
市道 号道路新設工事	0	0	0	135,000	141,750	617,780	1,206,780	1,206,780	1,206,780	1,206,780
90 -00	0	0	0	0	105,000	19,740,000	0	0	0	19,845,000
市道 x x 号道路改良工事	0	0	0	0	105,000	19,845,000	19,845,000	19,845,000	19,845,000	19,845,000
	0	0	388,000	2,310,300	14,400,150	38,836,330	8,185,350	0	0	64,120,130
合計	0	0	388,000	2,698,300	17,098,450	55,934,780	64,120,130	64,120,130	64,120,130	64,120,130

工事別・工事別に仕入先の内訳・仕入別・仕入別に工事の内訳で印刷することができます。

仕入先別費用集計表

出力期間 平成13年04月01日～平成14年03月31日（税抜き）

ページ 1

仕入先名	工事名	山口邸新築工	永田邸新築工	長尾邸新築工	石川マンショ	国道	号道	水路改良工事	市道	号道	市道××号道	合計
北海道建材株式会社		790,000	2,000,000		500,000			175,500	5,270,000	141,750	365,000	9,242,250
青森建材株式会社		1,200,000	1,500,000	800,000								3,500,000
岩手興業株式会社		820,800										820,800
宮城バルブ株式会社					3,310,000							3,310,000
秋田管材有限会社					1,900,000							1,900,000
山形商会株式会社					3,100,000							3,100,000
福島木材株式会社				2,000,000								2,000,000
栃木生コン株式会社						1,000,000						1,000,000
群馬生コン株式会社											5,000,000	5,000,000
埼玉砕石株式会社							110,000					110,000
東京金物商店					42,800							42,800
新潟建設株式会社		1,055,000										1,055,000
福井工務店											9,000,000	9,000,000
長野建設				3,680,000								3,680,000
静岡鉄工株式会社		1,500,000										1,500,000
滋賀防水有限会社		360,000										360,000
熊本設備株式会社					2,050,000							2,050,000
大分設備					1,626,000							1,626,000
沖縄石油株式会社					546,400							546,400
浅倉文具店					40,000							40,000
合計		5,725,800	3,500,000	6,480,000	13,115,200	1,285,500		5,270,000	141,750		14,365,000	49,883,250
縦軸と横軸に仕入先と工事をもってマトリックスで印刷します。件数が増えると次ページに印刷されます。仕入先と工事の数字が一度に確認できる究極の帳票です。												

未収入金管理表

平成13年08月度

作成日 平成13年08月31日 ページ 1

集計期間 平成13年08月01日 ~ 平成13年08月31日

コード	請負先名	契約金額	前月迄入金	現金	手形	振込	相殺	その他	当月入金 (~)	入金累計 (+)	未収入金 -	備考
0001	東日本建設株式会社	36,750,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	33,750,000	
0002	西日本建設株式会社	66,950,000	18,250,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	26,250,000	40,700,000	
0003	四国建設株式会社	21,630,000	3,163,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	11,163,000	10,467,000	
0004	九州建設株式会社	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
0005	県	76,950,000	24,020,250	0	0	8,079,750	0	0	8,079,750	32,100,000	44,850,000	
0006	市	84,460,000	0	0	0	22,660,000	0	0	22,660,000	22,660,000	61,800,000	
9999	諸口	87,425,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	81,925,000	
	合計	424,165,000	53,933,250	0	0	46,739,750	0	0	46,739,750	100,673,000	323,492,000	
<p>請負先別・現場担当者別・営業担当者別・部門別で印刷できます。 工事の内訳を印刷するかしないかの選択もできます。</p>												

未収入金管理表

平成13年08月度

作成日 平成13年08月31日 ページ 1

集計期間 平成13年08月01日～平成13年08月31日

コード	請負先名	契約金額	前月迄入金	現金	手形	振込	相殺	その他	当月入金 (~)	入金累計 (+)	未収入金 -	完成日
0001	東日本建設株式会社 石川マンション設備工事 請負先計	36,750,000 36,750,000	3,000,000 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,000,000 3,000,000	33,750,000 33,750,000	未成
0002	西日本建設株式会社 水路改良工事 請負先計	66,950,000 66,950,000	18,250,000 18,250,000	0 0	0 0	8,000,000 8,000,000	0 0	0 0	8,000,000 8,000,000	26,250,000 26,250,000	40,700,000 40,700,000	未成
0003	四国建設株式会社 今井橋梁改修工事 請負先計	21,630,000 21,630,000	3,163,000 3,163,000	0 0	0 0	8,000,000 8,000,000	0 0	0 0	8,000,000 8,000,000	11,163,000 11,163,000	10,467,000 10,467,000	未成
0004	九州建設株式会社 工事なし 請負先計	50,000,000 50,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50,000,000 50,000,000	
0005	県 国道 号道路改良工事 請負先計	76,950,000 76,950,000	24,020,250 24,020,250	0 0	0 0	8,079,750 8,079,750	0 0	0 0	8,079,750 8,079,750	32,100,000 32,100,000	44,850,000 44,850,000	未成
0006	市 市道 号道路新設工事 市道 × × 号道路改良工事 市道 号道路改良工事 請負先計	61,800,000 22,660,000 0 84,460,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 22,660,000 0 22,660,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 22,660,000 0 22,660,000	0 22,660,000 0 22,660,000	61,800,000 0 0 61,800,000	未成 H.13/08/31 未成
9999	諸口 山口邸新築工事 永田邸新築工事 長尾邸新築工事 請負先計	26,000,000 52,500,000 8,925,000 87,425,000	3,000,000 0 2,500,000 5,500,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 2,500,000 5,500,000	3,000,000 0 2,500,000 5,500,000	23,000,000 52,500,000 6,425,000 81,925,000	未成 未成 H.13/08/25
	合 計	424,165,000	53,933,250	0	0	46,739,750	0	0	46,739,750	100,673,000	323,492,000	
工事付きで印刷した場合です。												

仕入先台帳

出力期間 平成13年06月01日 ~ 平成13年07月31日

0001 北海道建材株式会社

作成日 平成13年07月31日 ページ 1

日付	区分	要素	工事名	名称	仕様	数量	単価	仕入金額	消費税	支払金額	差引金額
				繰越金額							0
06/15	仕入	材料	市道 号道路新設工	生コン160-8-40		10	10000	100,000	5,000		105,000
	"	"	"	ヒュム管B-1		10	3500	35,000	1,750		141,750
				平成13年06月度 計				135,000	6,750	0	
07/10	現金		山口邸新築工事							141,750	0
07/15	仕入	材料	国道 号道路改良工	U型側溝 300X300X600		50	1350	67,500	3,375		70,875
	"	"	"	ヒュム管B-1		70	3500	245,000	12,250		328,125
	"	"	水路改良工事	栗石		30	2500	75,000	3,750		406,875
	"	"	"	砂		30	3000	90,000	4,500		501,375
	"	"	"	砕石 C-40		40	4400	176,000	8,800		686,175
	"	"	"	生コン160-8-20		20	10500	210,000	10,500		906,675
	"	"	"	生コン160-8-40		30	10000	300,000	15,000		1,221,675
	"	"	"	塩ビ管 VU 直管		5	150000	750,000	37,500		2,009,175
	"	"	市道 号道路新設工	U型側溝 300X300X600		5	1350	6,750	338		2,016,263
	"	"	市道 x x 号道路改良工	生コン160-8-20		10	10500	105,000	5,250		2,126,513
07/18	"	"	水路改良工事	生コン160-8-40		20	10000	200,000	10,000		2,336,513
	"	"	"	生コン160-8-20		15	10500	157,500	7,875		2,501,888
	"	"	"	栗石		25	2500	62,500	3,125		2,567,513
	"	"	"	砂		20	3000	60,000	3,000		2,630,513
				平成13年07月度 計				2,505,250	125,263	141,750	
				合 計				2,640,250	132,013	141,750	2,630,513

書式変更できるので印鑑等の項目も作成できます。

平成13年08月度

未払金管理表

作成日 平成13年08月31日 ページ 1

集計期間 平成13年08月01日 ~ 平成13年08月31日

コード	仕入先名	前期残高	前月迄仕入	前月迄支払	前月残高 (+ -)	現金支払	手形支払	その他支払	当月支払計 (+ +)	税抜仕入額	消費税額	当月仕入計 (+)	未払金 - +
0001	北海道建材株式会社	2,663,540	2,772,263	2,805,290	2,630,513	0	2,630,513	0	2,630,513	3,632,000	181,600	3,813,600	3,813,600
0002	青森建材株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	53,350	1,120,350	1,120,350
0003	岩手興業株式会社	585,600	693,840	585,600	693,840	0	0	693,840	693,840	160,000	8,000	168,000	168,000
0004	宮城バルブ株式会社	2,580,000	3,475,500	2,830,000	3,225,500	0	3,225,500	0	3,225,500	0	0	0	0
0005	秋田管材有限会社	559,840	1,212,750	559,840	1,212,750	0	1,134,000	78,750	1,212,750	981,500	49,075	1,030,575	1,030,575
0006	山形商会株式会社	1,080,000	1,344,000	1,080,000	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000	300,000	15,000	315,000	315,000
0007	福島木材株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	100,000	2,100,000	2,100,000
0009	栃木生コン株式会社	1,280,000	630,000	0	1,910,000	0	1,280,000	630,000	1,910,000	485,500	24,275	509,775	509,775
0010	群馬生コン株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	250,000	5,250,000	5,250,000
0011	埼玉砕石株式会社	0	115,500	0	115,500	0	0	115,500	115,500	0	0	0	0
0013	東京金物商店	0	15,750	0	15,750	15,750	0	0	15,750	18,000	900	18,900	18,900
0015	新潟建設株式会社	0	740,250	0	740,250	0	0	740,250	740,250	350,000	17,500	367,500	367,500
0018	福井工務店	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	450,000	9,450,000	9,450,000
0020	長野建設	27,684,750	0	27,684,750	0	0	0	0	0	3,680,000	184,000	3,864,000	3,864,000
0022	静岡鉄工株式会社	0	1,102,500	0	1,102,500	0	1,102,500	0	1,102,500	450,000	22,500	472,500	472,500
0025	滋賀防水有限会社	0	126,000	0	126,000	126,000	0	0	126,000	240,000	12,000	252,000	252,000
0043	熊本設備株式会社	450,000	472,500	0	922,500	0	450,000	472,500	922,500	1,600,000	80,000	1,680,000	1,680,000
0044	大分設備	888,000	932,400	0	1,820,400	0	888,000	932,400	1,820,400	280,000	14,000	294,000	294,000
0047	沖縄石油株式会社	0	111,720	0	111,720	111,720	0	0	111,720	41,000	2,050	43,050	43,050
0051	浅倉文具店	0	18,900	0	18,900	18,900	0	0	18,900	13,000	650	13,650	13,650
	合 計	37,771,730	13,763,873	35,545,480	15,990,123	272,370	12,054,513	3,663,240	15,990,123	29,298,000	1,464,900	30,762,900	30,762,900

月末・原価締日・仕入先締日で印刷できます。

請求一覧表

平成13年08月度

作成日 平成13年08月31日 ページ 1

集計期間 平成13年07月21日 ~ 平成13年08月20日

コード	請負先名	前回請求額	現金入金	手形入金	振込入金	相殺	その他	入金合計 (~)	税売上額	消費税	税込売上合計 (+)	今回請求額 - +
0001	東日本建設株式会社	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	7,619,048	380,952	8,000,000	8,000,000
0002	西日本建設株式会社	21,250,000	0	8,000,000	5,250,000	0	0	13,250,000	13,390,000	669,500	14,059,500	22,059,500
0003	四国建設株式会社	19,163,000	0	0	3,163,000	0	0	3,163,000	0	0	0	16,000,000
0004	九州建設株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005	県	40,179,750	0	0	24,020,250	0	0	24,020,250	7,695,000	384,750	8,079,750	24,239,250
0006	市	22,660,000	0	0	22,660,000	0	0	22,660,000	0	0	0	0
9999	諸口	14,250,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	23,261,904	0	23,261,904	34,511,904
	合 計	120,502,750	0	14,000,000	55,093,250	0	0	69,093,250	51,965,952	1,435,202	53,401,154	104,810,654
<p>請負先別・現場担当者別・営業担当者別・部門別で印刷できます。 集計日も月末・原価締日・請負先締日を選べます。 月末を選択すると表題が売掛残高一覧表に名前が変わります。</p>												

請求一覧表

集計期間 平成13年07月21日～平成13年08月20日

コード	請負先名 工事名	前回請求額	現金入金	手形入金	振込入金	相殺	その他	入金合計 (~)	税売上額	消費税	税込売上合計 (+)	今回請求額 - +
0001 40 -00	東日本建設株式会社 石川マンション設備工事 請負先計	3,000,000 3,000,000	0 0	3,000,000 3,000,000	0 0	0 0	0 0	3,000,000 3,000,000	7,619,048 7,619,048	380,952 380,952	8,000,000 8,000,000	8,000,000 8,000,000
0002 60 -00	西日本建設株式会社 水路改良工事 請負先計	21,250,000 21,250,000	0 0	8,000,000 8,000,000	5,250,000 5,250,000	0 0	0 0	13,250,000 13,250,000	13,390,000 13,390,000	669,500 669,500	14,059,500 14,059,500	22,059,500 22,059,500
0003 70 -00	四国建設株式会社 今井橋梁改修工事 請負先計	19,163,000 19,163,000	0 0	0 0	3,163,000 3,163,000	0 0	0 0	3,163,000 3,163,000	0 0	0 0	0 0	16,000,000 16,000,000
0005 50 -00	県 国道 号道路改良工事 請負先計	40,179,750 40,179,750	0 0	0 0	24,020,250 24,020,250	0 0	0 0	24,020,250 24,020,250	7,695,000 7,695,000	384,750 384,750	8,079,750 8,079,750	24,239,250 24,239,250
0006 80 -00 90 -00 91 -00	市 市道 号道路新設工事 市道 × 号道路改良工事 市道 号道路改良工事 請負先計	0 22,660,000 0 22,660,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 22,660,000 0 22,660,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 22,660,000 0 22,660,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9999 10 -00 20 -00 30 -00	諸口 山口邸新築工事 永田邸新築工事 長尾邸新築工事 請負先計	3,000,000 6,000,000 5,250,000 14,250,000	0 0 0 0	3,000,000 0 0 3,000,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3,000,000 0 0 3,000,000	4,761,904 15,000,000 3,500,000 23,261,904	0 0 0 0	4,761,904 15,000,000 3,500,000 23,261,904	4,761,904 21,000,000 8,750,000 34,511,904
	合計	120,502,750	0	14,000,000	55,093,250	0	0	69,093,250	51,965,952	1,435,202	53,401,154	104,810,654

工事を付けて印刷した場合です。

御 請 求 書

作成日 平成13年08月31日

〒 108
神奈川県横浜市港北区 3 2 - 1

西日本建設株式会社 御中

平成13年08月分 (平成13年07月21日 ~ 平成13年08月20日)

〒 708-0052
岡山県津山市田町72 富士中央ビル5 F

アサクラ建設工業株式会社
TEL 0868-22-2222
FAX 0868-33-3333

下記の通り御請求申し上げます。

御請求額 ¥22,059,500-

第一勧業銀行 津山支店 (当) 12345678
三菱銀行 津山支店 (普) 23456789

工事名	水路改良工事
工事場所	

前回御請求額	今回御入金額	今回売上額	御請求額(C)
21,250,000	13,250,000	14,059,500	22,059,500

契約金額	前月迄領収額	領収合計	課税対象額	調整額	消費税額	消費税調整額	税込売上額	差引残高
(A)		(B)						(A)-(B)-(C)
66,950,000	5,000,000	18,250,000	13,390,000	0	669,500	0	14,059,500	26,640,500

請求書は書式変更に対応しているため、項目の名称の変更等が可能です。
これは合計タイプの場合です。もちろん会社のロゴの印刷もできます。

〒 105-0000
東京都港区青山6丁目12-2

御 請 求 書

作成日 平成13年08月31日

ページ 1

県 御中

下記の通り御請求申し上げます。

御請求額 ¥24,239,250-

平成13年08月分 (平成13年07月21日 ~ 平成13年08月20日)

〒 708-0052
岡山県津山市田町72 富士中央ビル5F

アサクラ建設工業株式会社
TEL 0868-22-2222
FAX 0868-33-3333

第一勧業銀行 津山支店 (当) 12345678
三菱銀行 津山支店 (普) 23456789

前回御請求額	今回御入金額	繰越金額	税売上額	消費税額	税込売上額	今回御請求額
40,179,750	24,020,250	16,159,500	7,695,000	384,750	8,079,750	24,239,250

月/日	区分	工事名	摘要	数量	単位	単価	金額	消費税額
07/31	振込	国道 号道路改良工事	振込み				21,920,250	
	"	"	"				2,100,000	
08/20	売上	"	"	1	式		7,695,000	384,750
		合計	税抜額(7,695,000) 調整額(0) 消費税(384,750) 税調整(0)				税込額(8,079,750) 御入金(24,020,250)	

請求書は書式変更に対応しているので、項目の名称の変更とか縦書き等で印刷します。
これは明細タイプの場合です。

〒 107-8544
東京都港区青山1 - 15 - 5

御 請 求 書

作成日 平成13年08月25日

ページ 2

リコー建設株式会社 御中

下記の通り御請求申し上げます。

御請求額 ¥4,761,904-

平成13年08月分 (平成13年07月21日 ~ 平成13年08月20日)

〒 708-0052
岡山県津山市田町72 富士中央ビル5F

アサクラ建設工業株式会社

TEL 0868-22-2222

FAX 0868-33-3333

前回御請求額	今回御入金額	繰越金額	税抜売上額	消費税額	税込売上額	今回御請求額
3,000,000	3,000,000	0	4,761,904	0	4,761,904	4,761,904

第一勧業銀行 津山支店 (当) 12345678
三菱銀行 津山支店 (普) 23456789

月/日	区分	工事名	摘要	数量	単位	単価	金額	消費税額
08/20	売上	山口邸新築工事	水盛り方	70	m ²	390	27,300	
	売上	"	墨出し	70	m ²	430	30,100	
	売上	"	外部足場	70	m ²	900	63,000	
	売上	"	内部足場	70	m ²	510	35,700	
	売上	"	機械器具損料	1	式		86,904	
	売上	"	養生費	70	m ²	400	28,000	
	売上	"	安全設備費	1	式		110,000	
	売上	"	片付清掃費	70	m ²	500	35,000	
	売上	"	完成時クリーニング	50	m ²	620	31,000	
	売上	"	根切り	50	m ³	3,100	155,000	
	売上	"	埋戻し	50	m ³	3,070	153,500	
	売上	"	残土処分	50	m ³	6,180	309,000	
	売上	"	土間鋤取り	50	m ³	2,230	111,500	
	売上	"	整地、均し	50	m ²	250	12,500	
	売上	"	砕石地業	50	m ³	9,000	450,000	
	売上	"	捨てコンクリート	20	m ³	18,350	367,000	
	売上	"	普通コンクリート	20	m ³	11,800	236,000	
	売上	"	捨コンクリート	16	m ³	13,300	212,800	
	売上	"	型枠工事	180	m ²	5,320	957,600	
	売上	"	本体工事	5	t	270,000	1,350,000	
			工事計				4,761,904	

御 請 求 書

〒 107-8544
東京都港区青山 1 - 15 - 5

作成日 平成13年08月25日

ページ 3

リコー建設株式会社 御中

下記の通り御請求申し上げます。

御請求額 ¥8,750,000-

平成13年08月分 (平成13年07月21日 ~ 平成13年08月20日)

〒 708-0052
岡山県津山市田町72 富士中央ビル 5 F

アサクラ建設工業株式会社
TEL 0868-22-2222
FAX 0868-33-3333

前回御請求額	今回御入金額	繰越金額	税抜売上額	消費税額	税込売上額	今回御請求額
5,250,000	0	5,250,000	3,500,000	0	3,500,000	8,750,000

第一勧業銀行 津山支店 (当) 12345678
三菱銀行 津山支店 (普) 23456789

月/日	区分	工事名	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	消費税額
08/20	売 上	長尾邸新築工事	水盛り方	63.3	m ²	390	24,687	
	売 上	"	外部足場	251.2	m ²	1,100	276,320	
	売 上	"	内部足場	119.3	m ²	510	60,843	
	売 上	"	仮設電力費	1	式		155,000	
	売 上	"	仮設用水費	1	式		117,973	
	売 上	"	養生費	119.3	m ²	330	39,369	
	売 上	"	片付清掃費	119.3	m ²	550	65,615	
	売 上	"	仮設便所	1	式		85,000	
	売 上	"	運搬費	1	式		79,668	
	売 上	"	整地、均し	132	m ²	250	33,000	
	売 上	"	布基礎(無筋)	120.2	m	7,600	913,520	
	売 上	"	布基礎(無筋)	240.4	m	5,500	1,322,200	
	売 上	"	基礎天端均し	120.2	m	1,000	120,200	
	売 上	"	基礎刷毛引仕上げ	30.6	m	730	22,338	
	売 上	"	アンカーボルト	31	本	160	4,960	
	売 上	"	床下換気孔	8	枚	1,550	12,400	
	売 上	"	スリーブ(塩ビパイプ)	1.2	m	2,720	3,264	
	売 上	"	独立基礎	2	ヶ所	3,350	6,700	
	売 上	"	土間コンクリート(無筋)	20.2	m ²	3,220	65,044	
	売 上	"	束石	24	個	1,030	24,720	
	売 上	"	浴室まわり 腰壁	5.9	m ²	4,400	25,960	
	売 上	"	玄関床タイル張り(内外)	4.7	m ²	8,770	41,219	
			工 事 計				3,500,000	

〒 108
神奈川県横浜市港北区 3 2 - 1

御 請 求 書

作成日 平成13年08月31日

ページ 1

西日本建設株式会社 御中

下記の通り御請求申し上げます。

平成13年08月分 (平成13年07月21日 ~ 平成13年08月20日)

御請求額 ¥22,059,500-

水路改良工事

〒 708-0052
岡山県津山市田町72 富士中央ビル5 F

アサクラ建設工業株式会社
TEL 0868-22-2222
FAX 0868-33-3333

第一勧業銀行 津山支店 (当) 12345678
三菱銀行 津山支店 (普) 23456789

前回御請求額	今回御入金額	繰越金額	税売上額	消費税額	税込売上額	今回御請求額
21,250,000	13,250,000	8,000,000	13,390,000	669,500	14,059,500	22,059,500

月/日	区分	工事名	摘要	数量	単位	単価	金額	消費税額
07/31	手形	水路改良工事					8,000,000	
	振込	"					5,250,000	
08/20	売上	"		1	式		13,390,000	669,500
		合計	税抜額(13,390,000) 調整額(0) 消費税(669,500) 税調整(0)				税込額(14,059,500) 御入金(13,250,000)	

工事別明細タイプになります。一件の工事毎に出す形式です。

請負先元帳

出力期間 平成13年04月01日 ~ 平成14年03月31日

0002 西日本建設株式会社

作成日 平成13年08月31日 ページ 1

日付	区分	工事名	摘要	数量	単価	金額	消費税	入金額	差引残高
			繰越金額						5,000,000
05/31	手形	水路改良工事	手形受取り					5,000,000	0
			平成13年05月度 計			0	0	5,000,000	
06/20	売上	水路改良工事		1		12,619,048	630,952		13,250,000
			平成13年06月度 計			12,619,048	630,952	0	
07/20	売上	水路改良工事		1		8,000,000			21,250,000
07/31	手形	"						8,000,000	13,250,000
	振込	"						5,250,000	8,000,000
			平成13年07月度 計			8,000,000	0	13,250,000	
08/20	売上	水路改良工事		1		13,390,000	669,500		22,059,500
08/31	振込	"						8,000,000	14,059,500
			平成13年08月度 計			13,390,000	669,500	8,000,000	
09/30	振込	水路改良工事						14,059,500	0
			平成13年09月度 計			0	0	14,059,500	
			合 計			34,009,048	1,300,452	40,309,500	0
請負先毎に複数の請求と入金と残高がわかります。 一般的には得意先元帳とか売掛台帳にあたります									

工事元帳

出力期間 平成13年04月01日 ~ 平成13年09月30日

60 -00 水路改良工事

請負先0002 西日本建設株式会社

作成日 平成13年09月30日 ページ 1

日付	区分	摘要	数量	単位	単価	金額	消費税	入金額	差引残高
		繰越金額							5,000,000
05/31	手形	手形受取り						5,000,000	0
		平成13年05月度計				0	0	5,000,000	
06/20	売上		1	式		12,619,048	630,952		13,250,000
		平成13年06月度計				12,619,048	630,952	0	
07/20	売上		1	式		8,000,000			21,250,000
07/31	手形振込							8,000,000	13,250,000
		平成13年07月度計				8,000,000	0	13,250,000	8,000,000
08/20	売上振込		1	式		13,390,000	669,500		22,059,500
08/31		平成13年08月度計				13,390,000	669,500	8,000,000	14,059,500
09/30	振込							14,059,500	0
		平成13年09月度計				0	0	14,059,500	
		合計				34,009,048	1,300,452	40,309,500	0
工事毎の請求と入金と残高が確認できます。									

納品書

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

担当：浅倉 太郎
下記の通り納品致しましたのでご査収下さい。

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考		
石油ボイラー	PX-371RDG	1	台	168,000	168,000			
オイルタンク	MST-95C	1	台	30,000	30,000			
サーモ付シャワー栓	TMG40CRX	1	個	31,900	31,900			
管材・継手費		1	式	11,000	11,000			
保温工事費		1	式	35,000	35,000			
配管工事費		1	式	40,000	40,000			
諸経費		1	式	9,100	9,100			
出精値引き		1	式	-85,000	-85,000			
摘要：		合計	税抜	240,000	税額	12,000	総額	252,000

請求書

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

担当：浅倉 太郎
下記の通りご請求申し上げます。

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考		
石油ボイラー	PX-371RDG	1	台	168,000	168,000			
オイルタンク	MST-95C	1	台	30,000	30,000			
サーモ付シャワー栓	TMG40CRX	1	個	31,900	31,900			
管材・継手費		1	式	11,000	11,000			
保温工事費		1	式	35,000	35,000			
配管工事費		1	式	40,000	40,000			
諸経費		1	式	9,100	9,100			
出精値引き		1	式	-85,000	-85,000			
摘要：		合計	税抜	240,000	税額	12,000	総額	252,000

納品書

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

担当：浅倉 太郎

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事

下記の通り納品致しましたのでご査収下さい。

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
石油ボイラー	PX-371RDG	1	台	168,000	168,000	
オイルタンク	MST-95C	1	台	30,000	30,000	
サーモ付シャワー栓	TMG40CRX	1	個	31,900	31,900	
管材・継手費		1	式	11,000	11,000	
保温工事費		1	式	35,000	35,000	
摘要：		合計	税抜	税額	総額	次ページへ

請求書

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

担当：浅倉 太郎

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事

下記の通りご請求申し上げます。

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
石油ボイラー	PX-371RDG	1	台	168,000	168,000	
オイルタンク	MST-95C	1	台	30,000	30,000	
サーモ付シャワー栓	TMG40CRX	1	個	31,900	31,900	
管材・継手費		1	式	11,000	11,000	
保温工事費		1	式	35,000	35,000	
摘要：		合計	税抜	税額	総額	次ページへ

納品書(控)

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

担当：浅倉 太郎

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事

下記の通り納品致しましたのでご査収下さい。

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
石油ボイラー	PX-371RDG	1	台	168,000	168,000	
オイルタンク	MST-95C	1	台	30,000	30,000	
サーモ付シャワー栓	TMG40CRX	1	個	31,900	31,900	
管材・継手費		1	式	11,000	11,000	
保温工事費		1	式	35,000	35,000	
摘要：		合計	税抜	税額	総額	次ページへ

納品書

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事

担当: 浅倉 太郎
下記の通り納品致しましたのでご査収下さい。

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考		
配管工事費		1	式	40,000	40,000			
諸経費		1	式	9,100	9,100			
出精値引き		1	式	-85,000	-85,000			
摘要:		合計	税抜	240,000	税額	12,000	総額	252,000

請求書

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事

担当: 浅倉 太郎
下記の通りご請求申し上げます。

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考		
配管工事費		1	式	40,000	40,000			
諸経費		1	式	9,100	9,100			
出精値引き		1	式	-85,000	-85,000			
摘要:		合計	税抜	240,000	税額	12,000	総額	252,000

納品書(控)

平成 15 年 08 月 01 日 伝票 11

岡山県津山市田町 72

石原 栄一 様

〒 708-0052
岡山県津山市田町 72 番地
富士中央ビル 5 F
株式会社 浅倉建設工業

TEL 0868-12-3456

お客様コード 9999
工事コード 1508010-00 石油給湯機取付工事










担当: 浅倉 太郎
下記の通り納品致しましたのでご査収下さい。


名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考		
配管工事費		1	式	40,000	40,000			
諸経費		1	式	9,100	9,100			
出精値引き		1	式	-85,000	-85,000			
摘要:		合計	税抜	240,000	税額	12,000	総額	252,000

工事分析表

工事番号	H00 -00	未・完区分	未成	契約金額		請求履歴		入金履歴		実行予算	6,398,395	85.31		
工事名	石原邸新築工事	官民区分	民間	H15/01/01	7,500,000	H15/04/20	5,250,000	H15/04/30	5,250,000	発注金額	6,394,913	請求率 	93.33%	
工事場所	岡山県津山市川崎5 5	元・下請区分	元請			H15/11/20	2,100,000	H15/11/30	1,500,000	前月迄原価	6,174,841	回収率 	85.71%	
TEL/FAX		分類	建築一式							当月原価	22,355	消化率 	96.86%	
発注者	日本総合建設株式会社	部門	全体							累計原価	6,197,196	82.63	進捗率 	100%
予定工期	年月日 - 年月日	都道府県	岡山県							実行予算残	201,199		原価率 	85.31%
実際工期	年月日 - 年月日	事業の種類	舗装工事業							今後予想原価	0		粗利率 	14.69%
現場担当者	北島健二(月給)	構造	木造							最終予想原価	6,197,196	82.63		
営業担当者	北島健二(月給)									当初予定粗利	1,101,605	14.69		
備考		原価税区分	税抜き	税抜合計	7,500,000					最終予想粗利	1,302,804	17.37		
		請求税区分	税込み	消費税	375,000	請求合計	7,350,000	入金合計	6,750,000	差額	201,199			
				税込合計	7,875,000	未請求額	525,000	未収入金	1,125,000	支払金額	0			

工種名	実行予算	構成比	発注金額	当月原価	累計原価	予算残	消化%	進捗%	消化状況
直接仮設工事	440	6.88	440	0	440	0	100	100	
土・基礎工事	404	6.32	404	0	404	0	100	100	
木工事	3,013	47.09	3,013	0	3,013	0	100	100	
屋根工事	383	5.98	383	0	383	0	100	100	
左官工事	742	11.6	742	0	742	0	100	100	
建具工事	516	8.06	516	0	516	0	100	100	
ガラス工事	24	0.37	24	0	24	0	100	100	
塗装工事	173	2.71	173	0	173	0	100	100	
内装工事	252	3.94	252	0	252	0	100	100	
雑工事	120	1.88	120	12	12	108	10	100	
本体設備工事	227	3.55	227	0	227	0	100	100	
諸経費	103	1.62	100	10	10	93	10	100	
合計	6,398	100	6,395	22	6,197	201	96.86	100	

要素名	実行予算	構成比	発注金額	当月原価	累計原価	予算残	消化%	進捗%	4要素別実行予算構成比
材料費	440	6.88	440	0	440	0	100	100	
労務費	404	6.32	404	0	404	0	100	100	
外注費	4,905	76.66	4,905	0	4,905	0	100	100	
修繕費	173	2.71	173	0	173	0	100	100	
水道光熱費	252	3.94	252	0	252	0	100	100	
動力費	120	1.88	120	12	12	108	10	100	
燃料費	103	1.62	100	10	10	93	10	100	
小計	649	10.14	646	22	448	201	69	100	
合計	6,398	100	6,395	22	6,197	201	96.86	100	

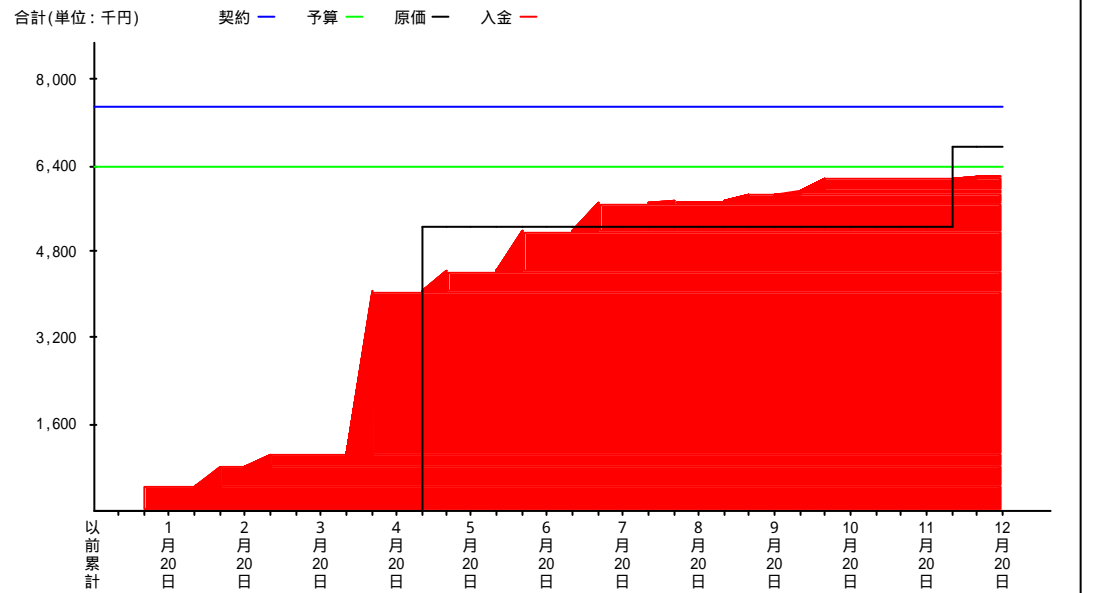

ほとんどの数字をグラフで把握できます。
